ICL

ใบตรวจรับงานระบบ SOLAR ROOFTOP

ชื่อลูกค้า : รวมโชคมอลล์เชียงใหม่

ที่อยู่ : 204 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

รายละเอียดงาน : Solar Cell ขนาด 760.50 kWp.

<u>รายการตรวจสอบ</u>

1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของการจับยึด MOUNTING

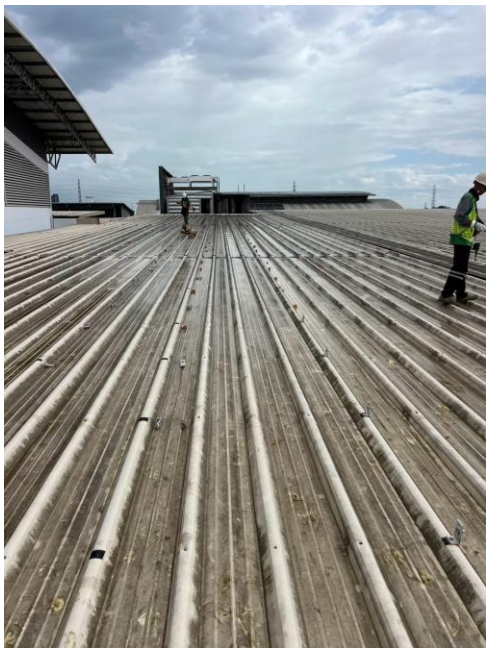

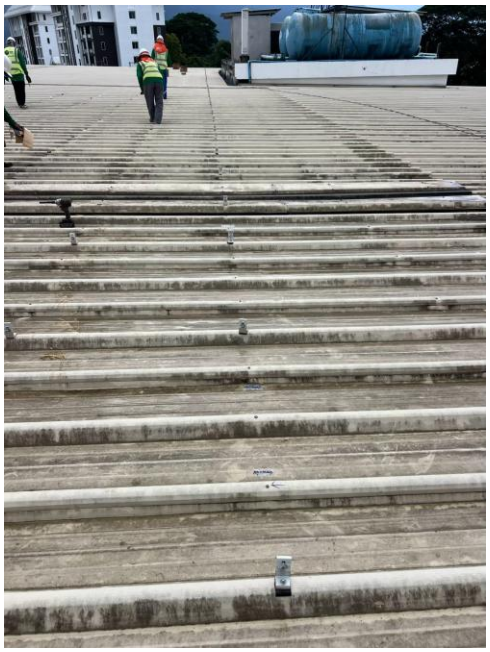

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

2. ตรวจสอบความมั่นคงของการจับยึดแผง SOLAR กับ MOUNTING

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

3. ชนิดขนาดรางและขนาดท่อตรงตามแบบ

3.1 ชนิดราง Perforated Tray

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

3.2 การจับยึดมั่นคงแข็งแรง

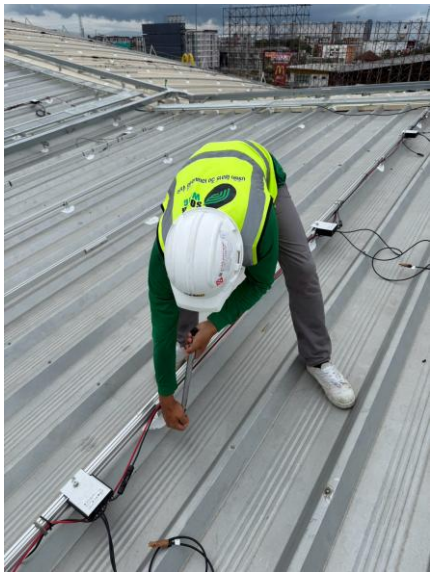

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

3.3 ระยะการจับยึด SUPPORT (ไม่เกิน 1.5M)

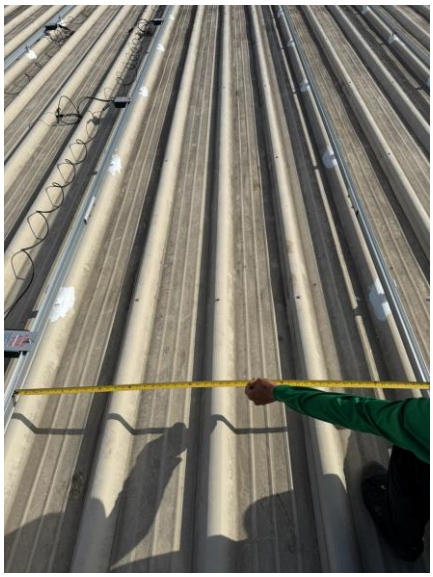

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.วัดพารามิเตอร์ต่างๆ หลังจากจ่ายไฟเทียบแบบ

INVERTER ขนาด 150 kW ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN5000-150K-MG0 5ชุด

แผง SOLAR ขนาด 650W รุ่น LONGI จำนวน 1,170 ชุด

เวลาขณะวัด 15:30 น. สภาพอากาศขณะวัด 29 องศาเซลเซียส

ค่า Vdc แผง SOLAR GROUP1 ตามแบบ Vdc วัดค่าได้จริง

4.1 สายไฟ DC (GROUP1) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.2 สายไฟ DC (GROUP1) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.3 สายไฟ DC (GROUP1) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.4 สายไฟ DC (GROUP2) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.5 สายไฟ DC (GROUP2) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.6 สายไฟ DC (GROUP2) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.7 สายไฟ DC (GROUP3) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.8 สายไฟ DC (GROUP3) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

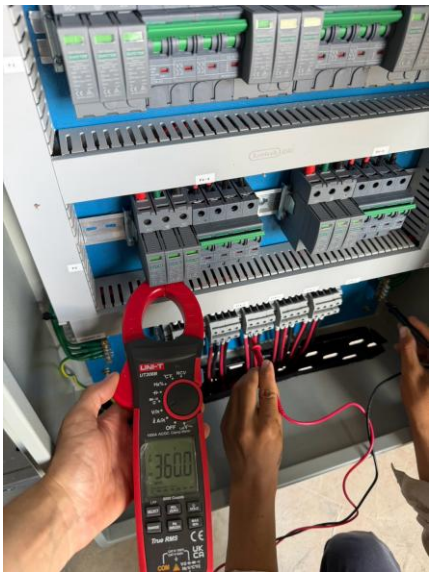

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.9 สายไฟ DC (GROUP3) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

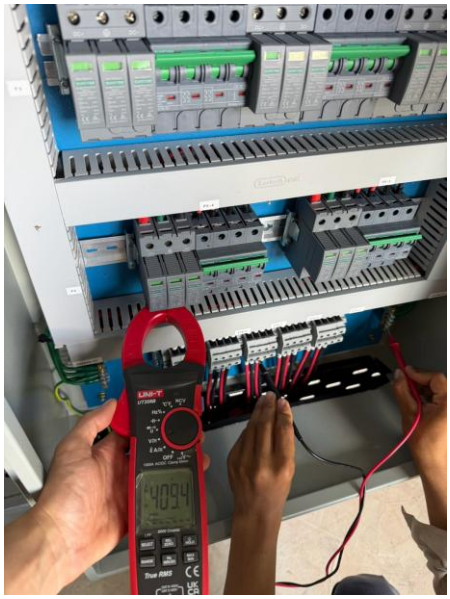

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.10 สายไฟ DC (GROUP4) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.11 สายไฟ DC (GROUP4) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.12 สายไฟ DC (GROUP4) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.13 สายไฟ DC (GROUP5) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.14 สายไฟ DC (GROUP5) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.15 สายไฟ DC (GROUP5) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.16 สายไฟ DC (GROUP6) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.17 สายไฟ DC (GROUP6) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

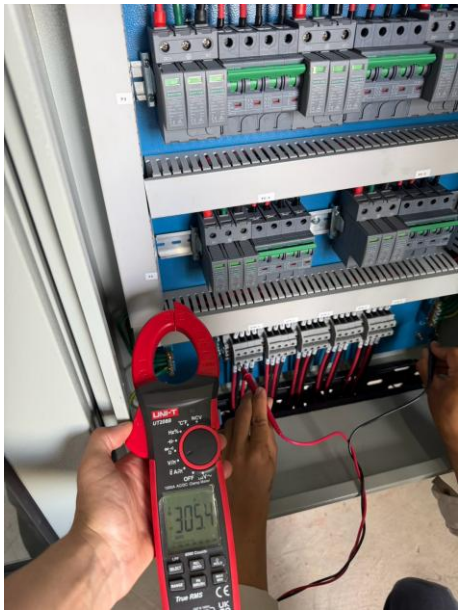

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.18 สายไฟ DC (GROUP6) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

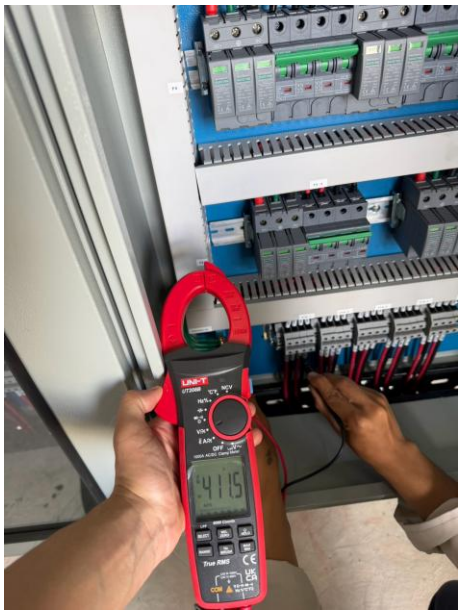

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.19 สายไฟ DC (GROUP7) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

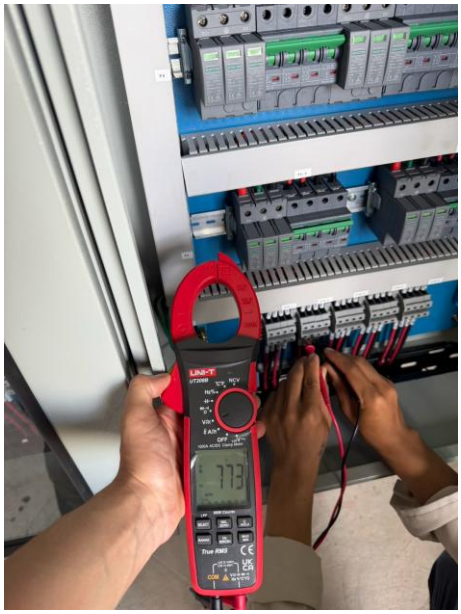

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.20 สายไฟ DC (GROUP7) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.21 สายไฟ DC (GROUP7) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

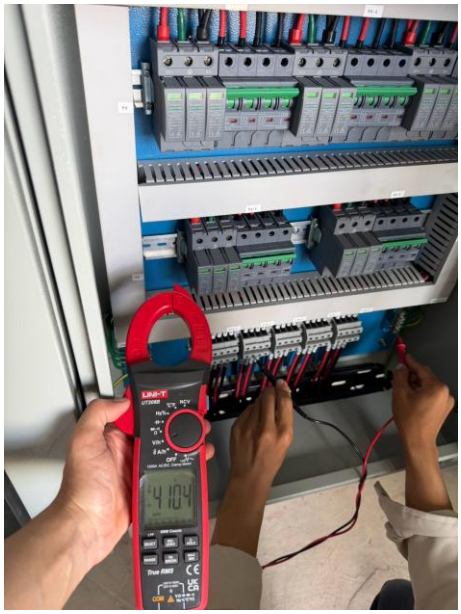

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.22 สายไฟ DC (GROUP8) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.23 สายไฟ DC (GROUP8) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.24 สายไฟ DC (GROUP8) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.25 สายไฟ DC (GROUP9) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.26 สายไฟ DC (GROUP9) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.27 สายไฟ DC (GROUP9) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

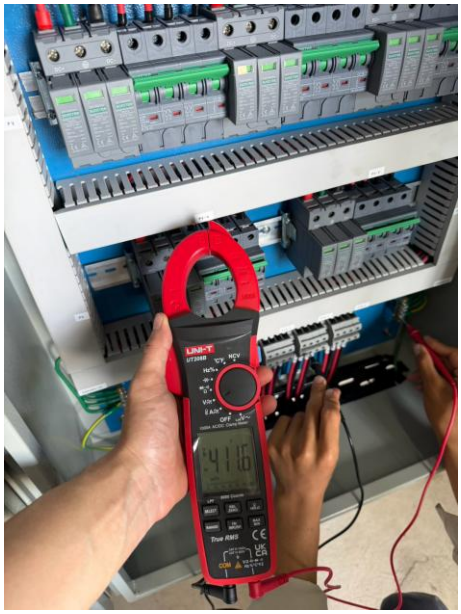

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.28 สายไฟ DC (GROUP10) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.29 สายไฟ DC (GROUP10) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.30 สายไฟ DC (GROUP10) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.31 สายไฟ DC (GROUP11) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.32 สายไฟ DC (GROUP11) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.33 สายไฟ DC (GROUP11) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.34 สายไฟ DC (GROUP12) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.35 สายไฟ DC (GROUP12) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.36 สายไฟ DC (GROUP12) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.37 สายไฟ DC (GROUP13) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.38 สายไฟ DC (GROUP13) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.39 สายไฟ DC (GROUP13) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.40 สายไฟ DC (GROUP14) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.41 สายไฟ DC (GROUP14) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.42 สายไฟ DC (GROUP14) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.43 สายไฟ DC (GROUP15) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.44 สายไฟ DC (GROUP15) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.45 สายไฟ DC (GROUP15) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.46 สายไฟ DC (GROUP16) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.47 สายไฟ DC (GROUP16) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.48 สายไฟ DC (GROUP16) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.49 สายไฟ DC (GROUP17) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.50 สายไฟ DC (GROUP17) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.51 สายไฟ DC (GROUP17) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.52 สายไฟ DC (GROUP18) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.53 สายไฟ DC (GROUP18) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.54 สายไฟ DC (GROUP18) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.55 สายไฟ DC (GROUP19) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.56 สายไฟ DC (GROUP19) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.57สายไฟ DC (GROUP19) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.58 สายไฟ DC (GROUP20) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.59 สายไฟ DC (GROUP20) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.60 สายไฟ DC (GROUP20) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.61 สายไฟ DC (GROUP21) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.62 สายไฟ DC (GROUP21) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.63 สายไฟ DC (GROUP21) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.64 สายไฟ DC (GROUP22) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.65 สายไฟ DC (GROUP22) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.66 สายไฟ DC (GROUP22) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.67 สายไฟ DC (GROUP23) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.68 สายไฟ DC (GROUP23) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.69 สายไฟ DC (GROUP23) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.70 สายไฟ DC (GROUP24) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.71 สายไฟ DC (GROUP24) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.72 สายไฟ DC (GROUP24) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.73 สายไฟ DC (GROUP25) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.74 สายไฟ DC (GROUP25) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.75 สายไฟ DC (GROUP25) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.76 สายไฟ DC (GROUP26) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.77 สายไฟ DC (GROUP26) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.78 สายไฟ DC (GROUP26) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.79 สายไฟ DC (GROUP27) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.80 สายไฟ DC (GROUP27) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.81 สายไฟ DC (GROUP27) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.82 สายไฟ DC (GROUP28) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.83 สายไฟ DC (GROUP28) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.84 สายไฟ DC (GROUP28) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.85 สายไฟ DC (GROUP29) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.86 สายไฟ DC (GROUP29) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.87 สายไฟ DC (GROUP29) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.88 สายไฟ DC (GROUP30) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.89 สายไฟ DC (GROUP30) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.90 สายไฟ DC (GROUP30) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.91 สายไฟ DC (GROUP31) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.92 สายไฟ DC (GROUP31) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.93 สายไฟ DC (GROUP31) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.94 สายไฟ DC (GROUP32) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.95 สายไฟ DC (GROUP32) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.96 สายไฟ DC (GROUP32) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.97 สายไฟ DC (GROUP33) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.98 สายไฟ DC (GROUP33) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.99 สายไฟ DC (GROUP33) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.100 สายไฟ DC (GROUP34) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.101 สายไฟ DC (GROUP34) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.102 สายไฟ DC (GROUP34) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.103 สายไฟ DC (GROUP35) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.104 สายไฟ DC (GROUP35) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.105 สายไฟ DC (GROUP35) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.106 สายไฟ DC (GROUP36) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.107 สายไฟ DC (GROUP36) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.108 สายไฟ DC (GROUP36) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.109 สายไฟ DC (GROUP37) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.110 สายไฟ DC (GROUP37) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.111 สายไฟ DC (GROUP37) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.112 สายไฟ DC (GROUP38) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.113 สายไฟ DC (GROUP38) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.114 สายไฟ DC (GROUP38) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.115 สายไฟ DC (GROUP39) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.116 สายไฟ DC (GROUP39) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.117 สายไฟ DC (GROUP39) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.118 สายไฟ DC (GROUP40) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.119 สายไฟ DC (GROUP40) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.120 สายไฟ DC (GROUP40) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.121 สายไฟ DC (GROUP41) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.122 สายไฟ DC (GROUP41) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.123 สายไฟ DC (GROUP41) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.124 สายไฟ DC (GROUP42) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.125 สายไฟ DC (GROUP42) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.126 สายไฟ DC (GROUP42) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.127 สายไฟ DC (GROUP43) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.128 สายไฟ DC (GROUP43) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.129 สายไฟ DC (GROUP43) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.130 สายไฟ DC (GROUP44) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.131 สายไฟ DC (GROUP44) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.132 สายไฟ DC (GROUP44) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.133 สายไฟ DC (GROUP45) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.134 สายไฟ DC (GROUP45) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.135 สายไฟ DC (GROUP45) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.136 สายไฟ DC (GROUP46) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.137 สายไฟ DC (GROUP46) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.138 สายไฟ DC (GROUP46) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.139 สายไฟ DC (GROUP47) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.140 สายไฟ DC (GROUP47) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.141 สายไฟ DC (GROUP47) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.142 สายไฟ DC (GROUP48) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.143 สายไฟ DC (GROUP48) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

4.144 สายไฟ DC (GROUP48) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1,000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5. ค่าความเป็นฉนวนของสายไฟ

5.1 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP1) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

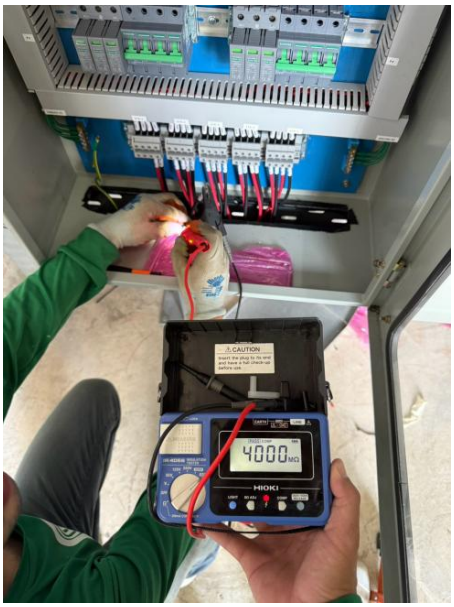

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.2 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP1) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.3 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP1) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

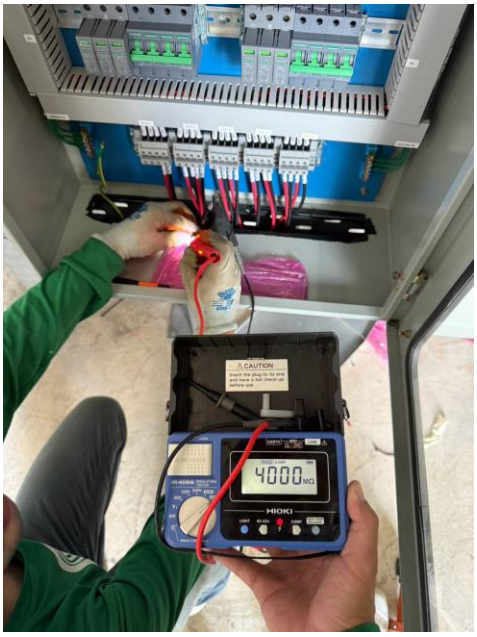

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.4 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP2) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.5 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP2) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

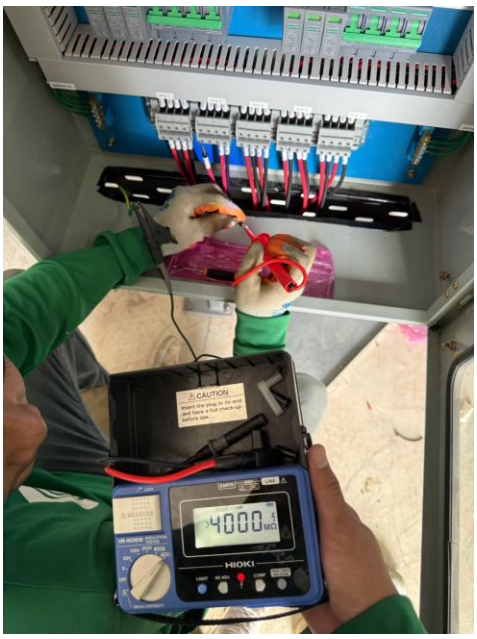

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.6 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP2) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

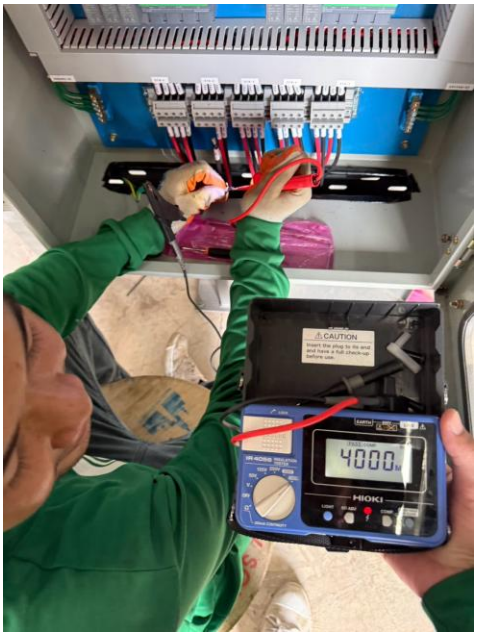

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.7 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP3) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.8 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP3) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.9 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP3) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.10 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP4) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.11 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP4) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.12 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP4) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.13 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP5) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.14 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP5) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.15 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP5) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.16 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP6) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.17 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP6) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.18 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP6) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

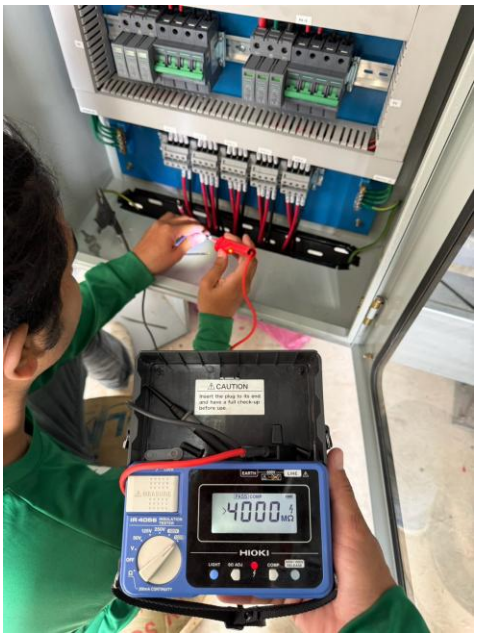

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.19 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP7) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.20 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP7) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.21 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP7) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.22 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP8) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.23 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP8) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.24 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP8) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.25 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP9) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

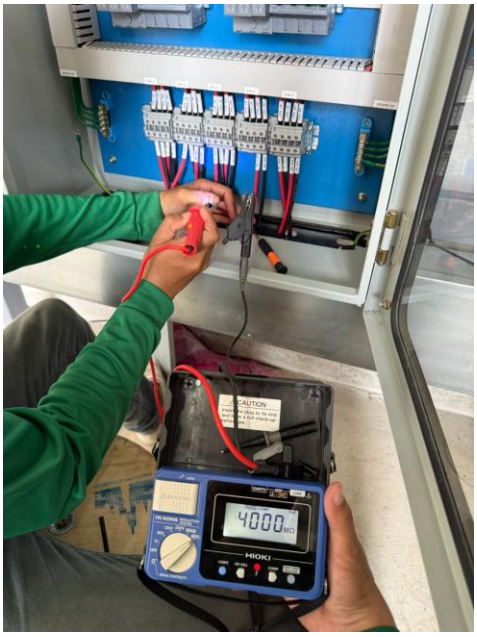

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.26 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP9) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.27 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP9) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.28 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP10) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.29 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP10) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.30 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP10) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.31 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP11) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.32 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP11) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.33 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP11) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

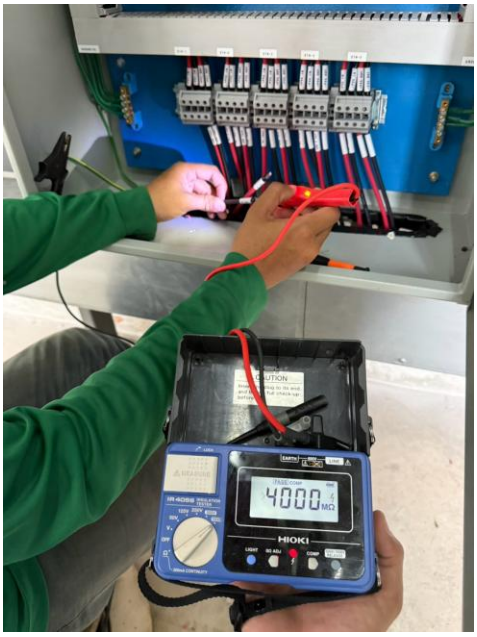

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.34 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP12) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.35 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP12) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.36 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP12) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.37 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP13) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.38 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP13) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.39 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP13) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.40 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP14) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.41 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP14) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.42 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP14) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.43 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP15) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.44 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP15) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.45 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP15) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.46 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP16) วัดที่สาย +,- วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.47 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP16) วัดที่สาย +,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.48 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP16) วัดที่สาย -,Ground วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

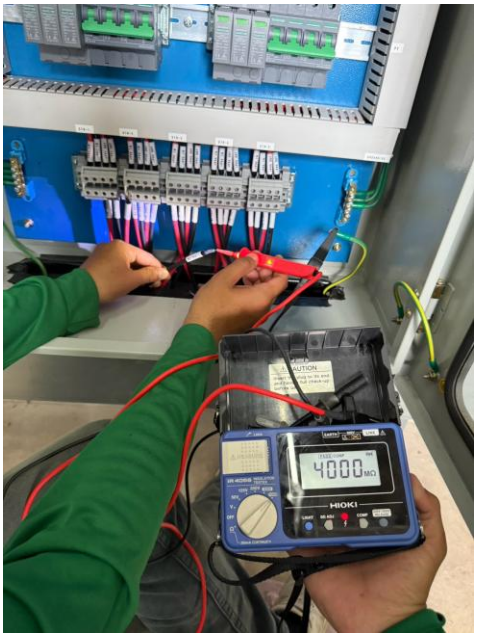

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.49 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP17) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.50 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP17) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.51 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP17) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.52 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP18) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.53 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP18) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.54 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP18) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.55 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP19) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

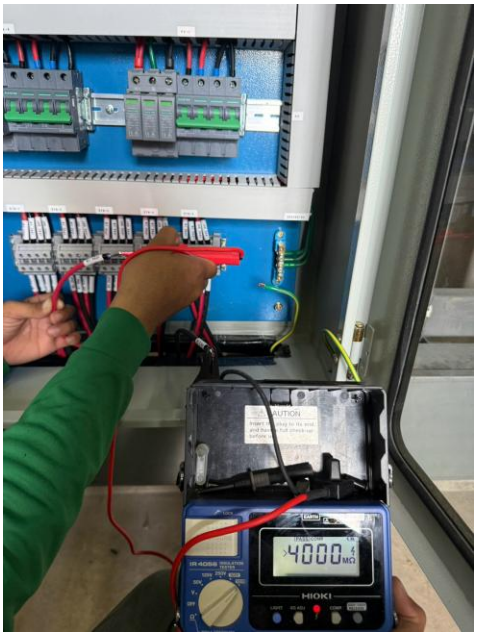

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.56 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP19) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.57 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP19) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.58 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP20) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.59 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP20) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.60 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP20) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.61 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP21) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

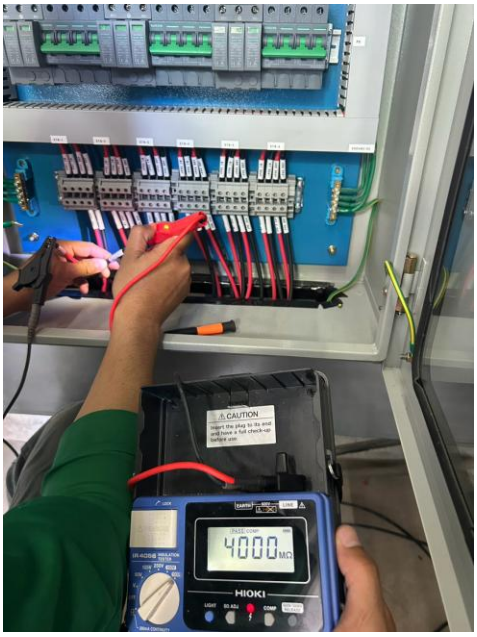

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.62 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP21) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.63 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP21) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.64 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP22) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.65 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP22) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

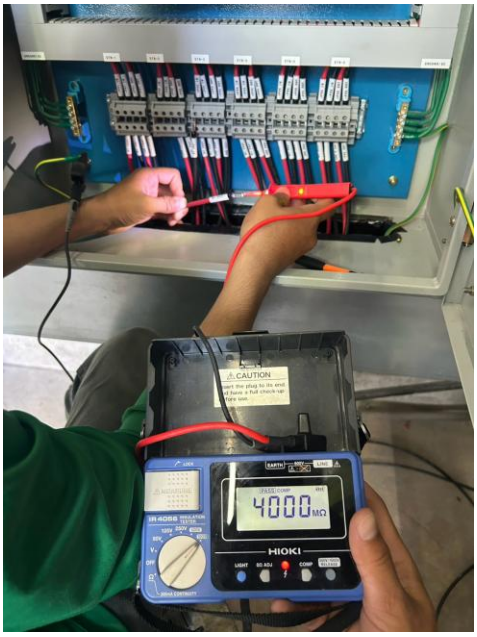

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.66 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP22) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

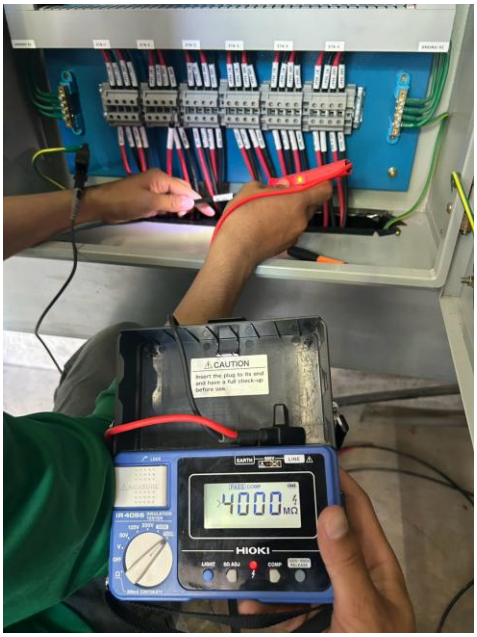

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.67 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP23) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.68 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP23) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

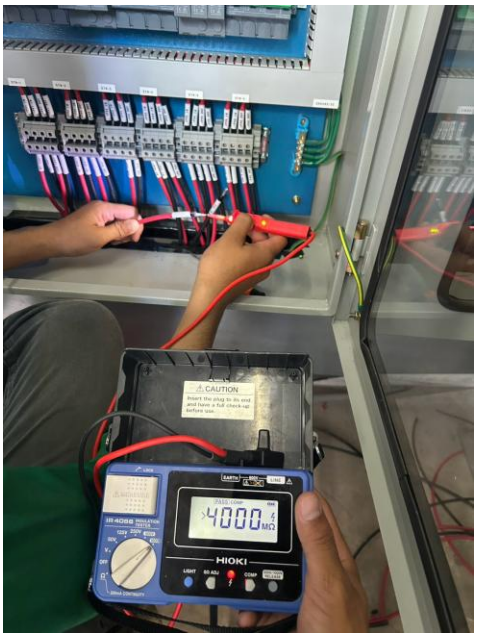

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.69 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP23) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.70 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP24) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.71 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP24) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

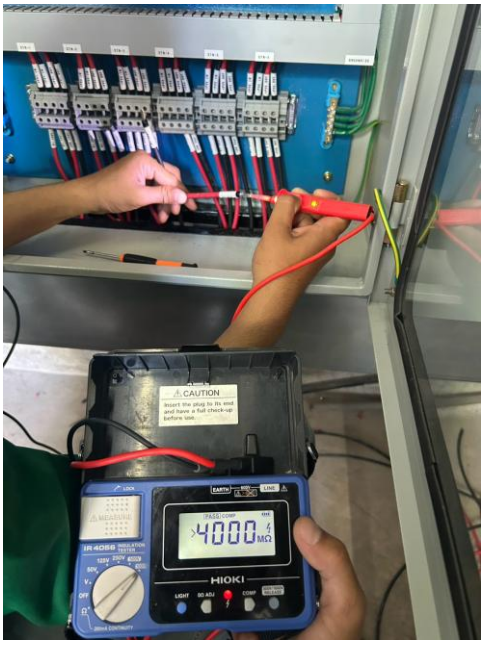

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.72 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP24) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.73 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP25) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

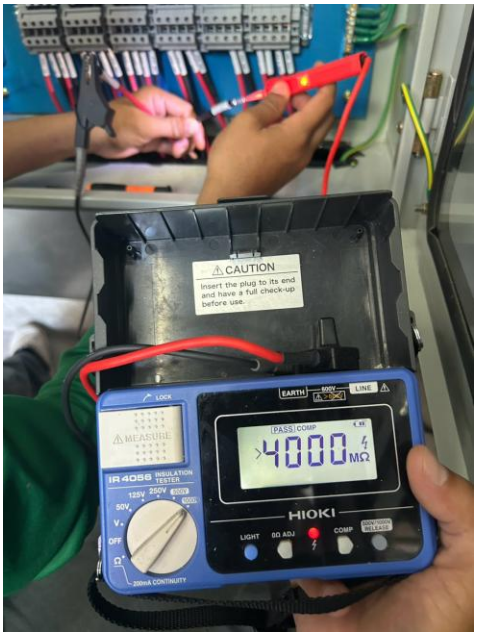

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.74 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP25) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.75 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP25) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

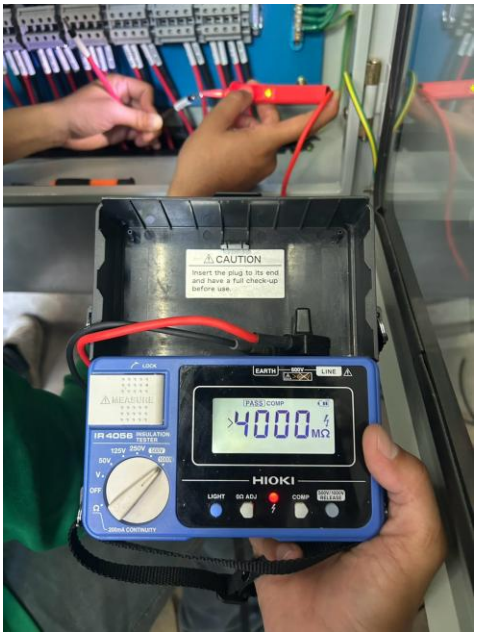

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.76 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP26) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.77 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP26) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.78 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP26) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.79 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP27) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

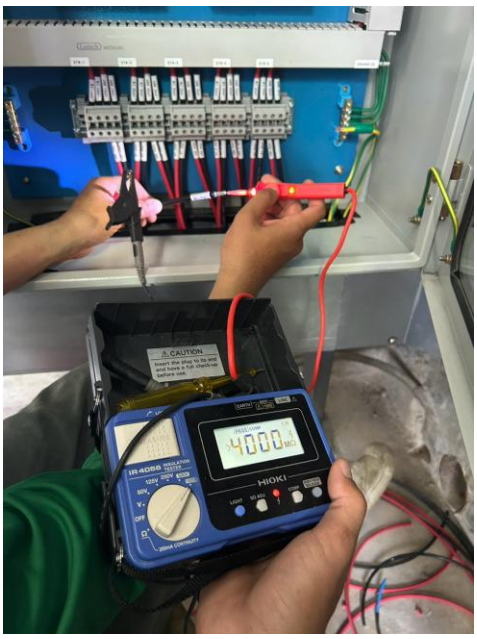

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.80 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP27) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

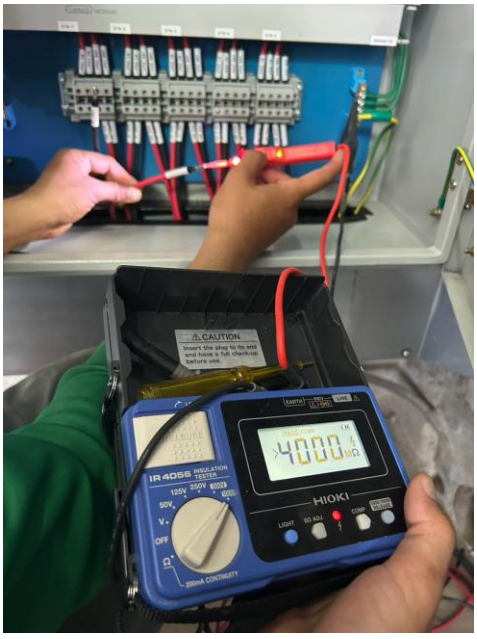

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.81 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP27) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

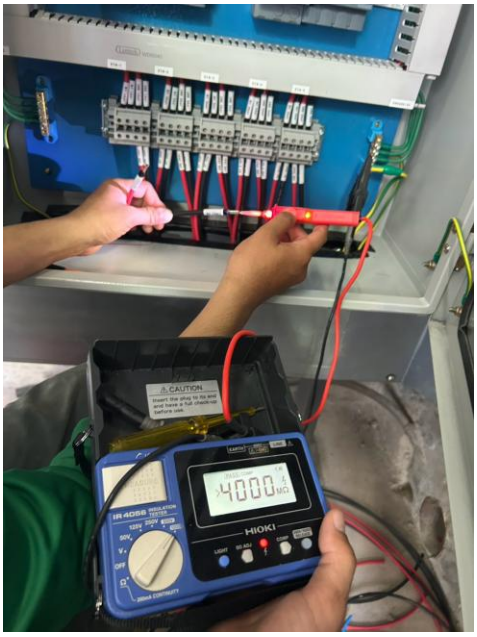

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.82 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP28) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.83 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP28) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

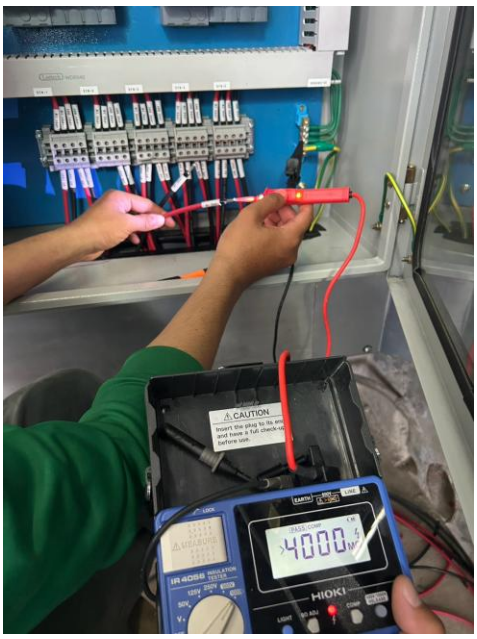

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.84 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP28) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.85 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP29) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

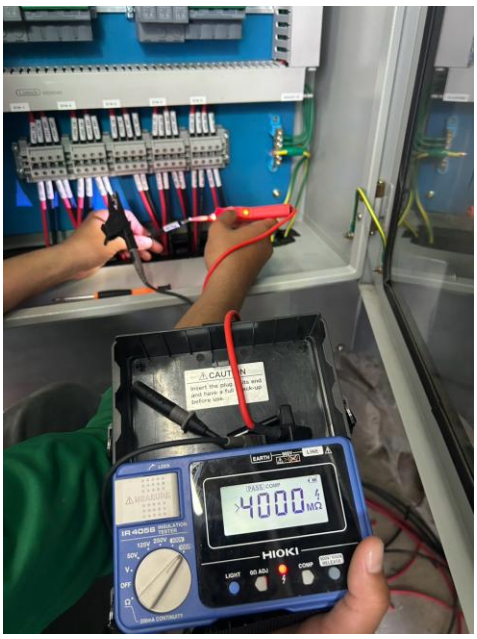

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.86 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP29) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

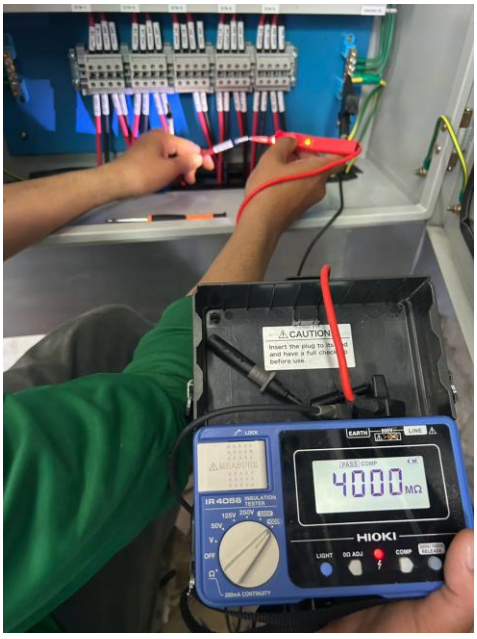

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.87 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP29) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

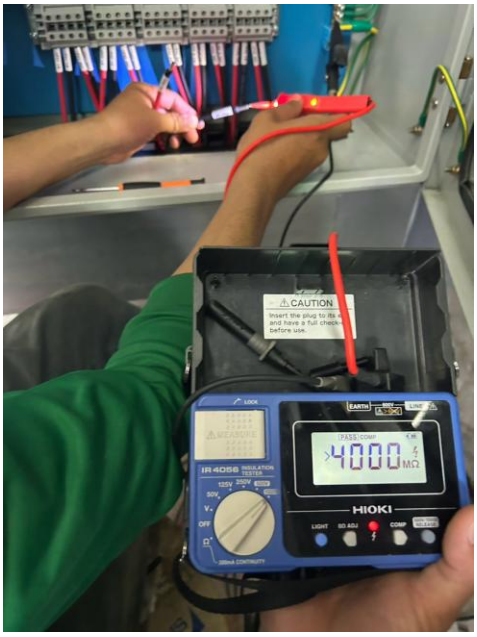

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.88 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP30) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.89 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP30) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.90 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP30) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.91 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP31) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.92 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP31) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.93 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP31) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.94 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP32) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.95 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP32) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

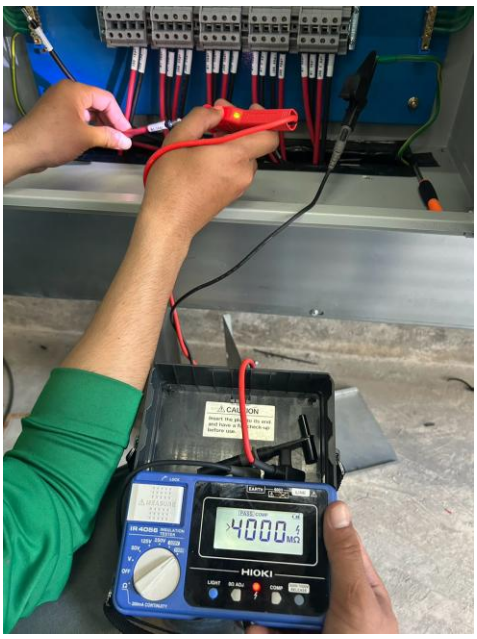

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.96 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP32) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

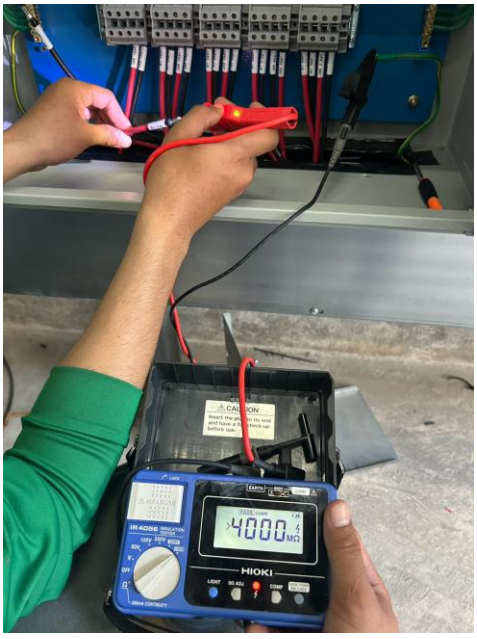

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.97 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP33) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.98 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP33) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

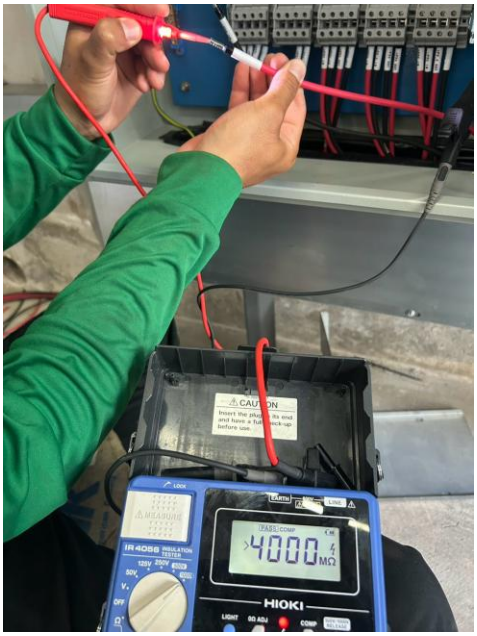

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.99 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP33) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.100 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP34) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.101 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP34) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.102 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP34) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.103 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP35) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.104 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP35) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.105 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP35) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.106 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP36) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.107 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP36) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.108 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP36) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.109 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP37) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.110 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP37) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.111 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP37) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.112 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP38) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.113 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP38) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.114 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP38) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.115 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP39) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

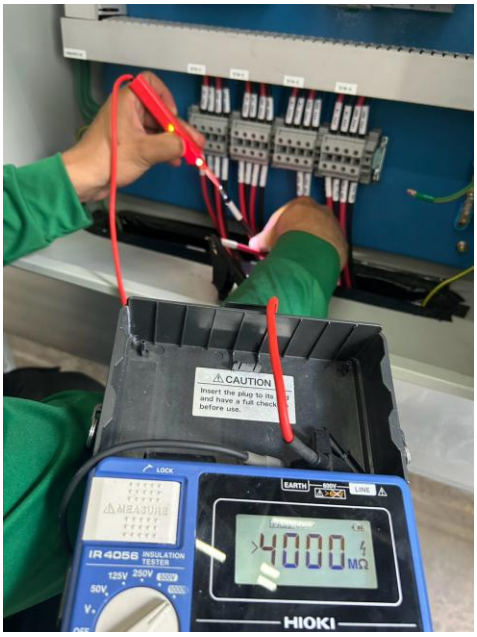

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.116 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP39) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

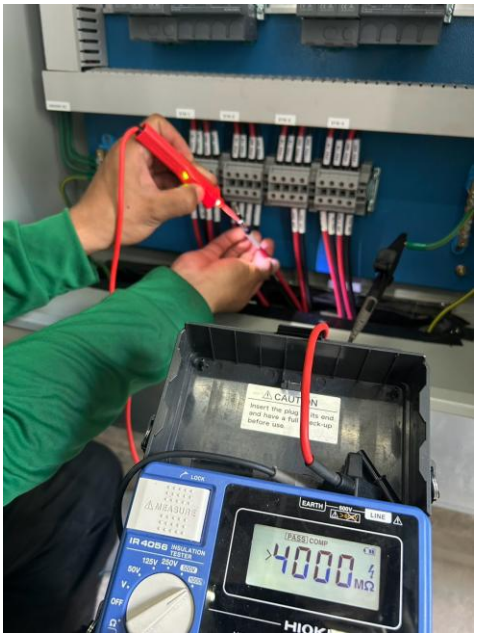

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.117 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP39) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.118 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP40) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.119 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP40) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

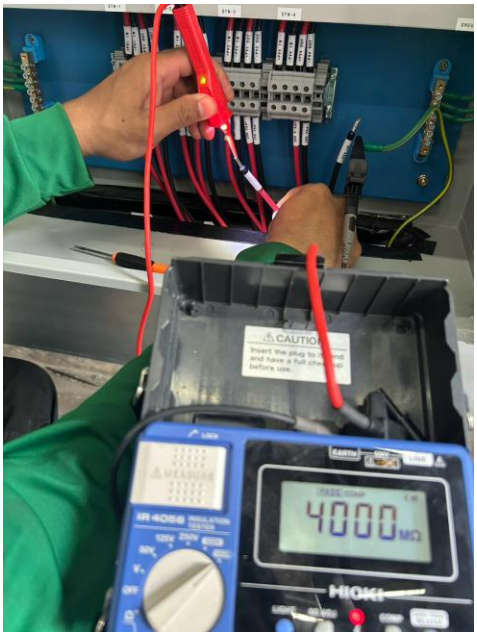

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.120 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP40) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.121 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP41) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.122 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP41) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

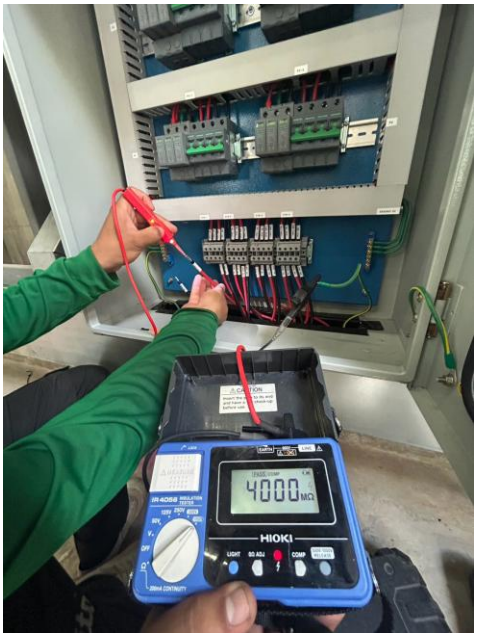

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.123 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP41) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

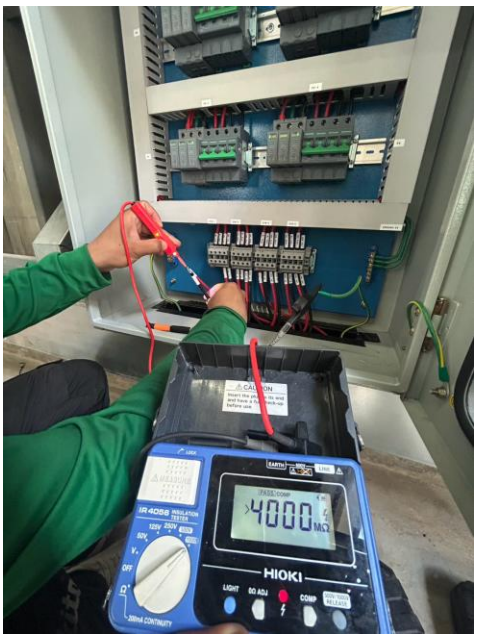

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.124 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP42) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.125 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP42) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.126 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP42) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

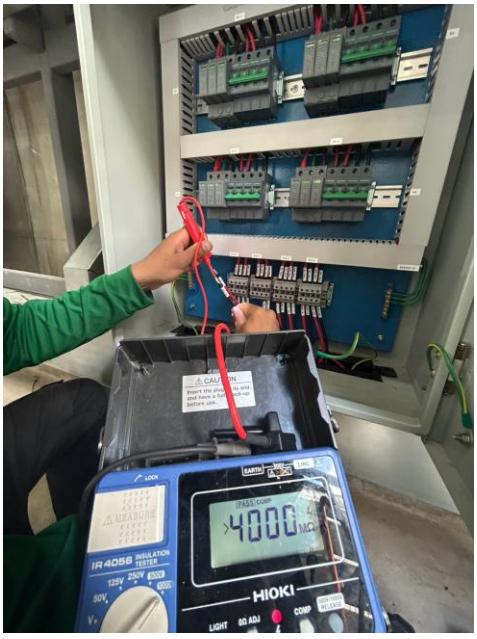

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.127 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP43) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.128 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP43) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

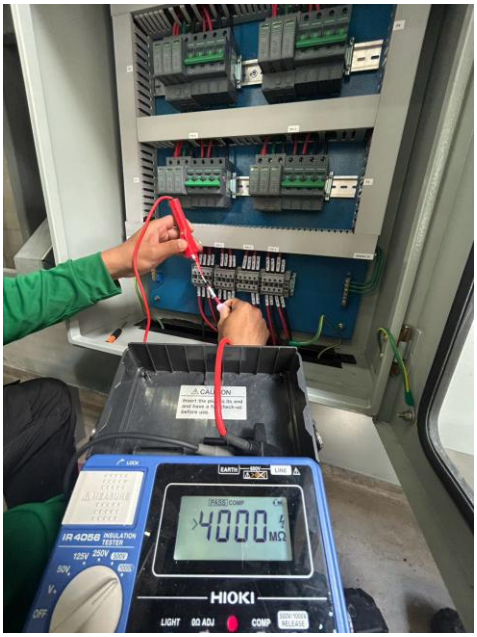

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.129 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP43) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.130 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP44) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.131 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP44) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.132 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP44) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.133 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP45) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

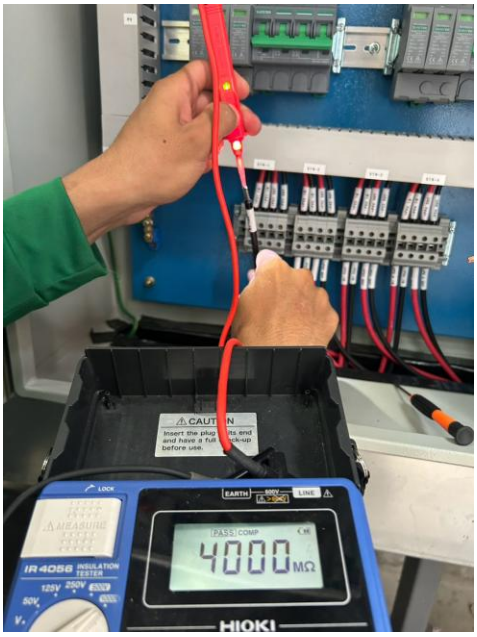

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.134 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP45) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

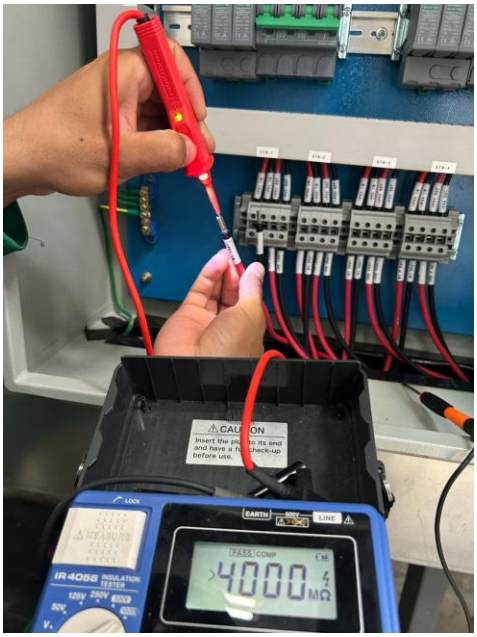

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.135 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP45) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

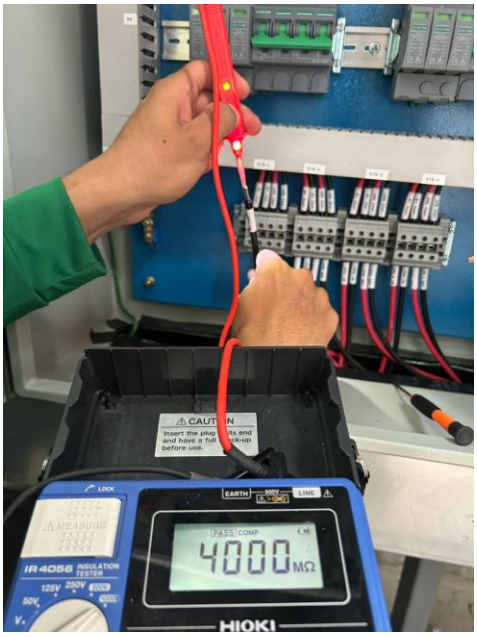

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.136 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP46) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

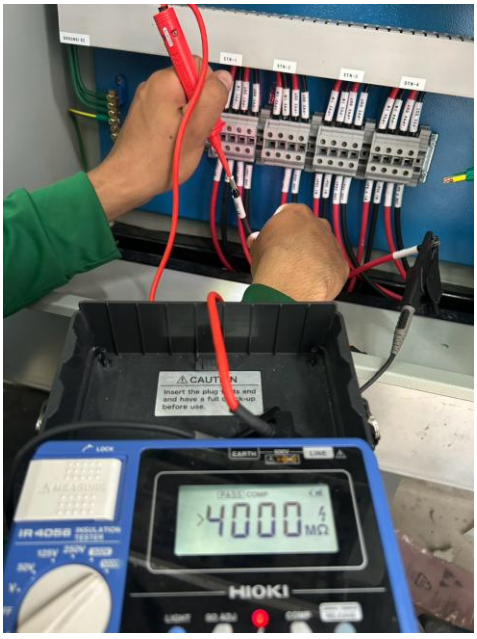

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.137 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP46) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.138 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP46) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

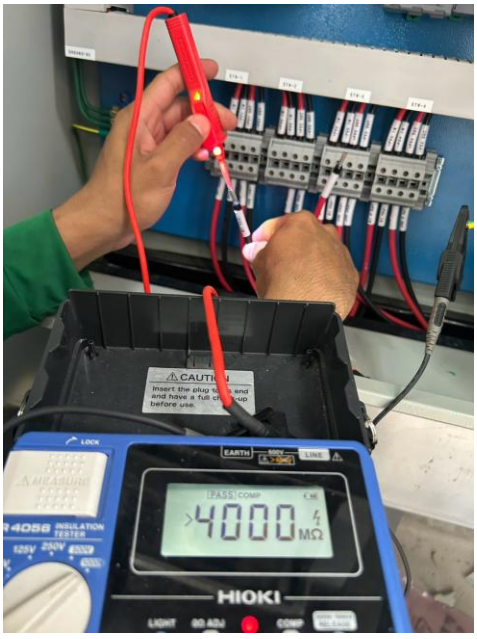

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.139 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP47) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.140 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP47) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

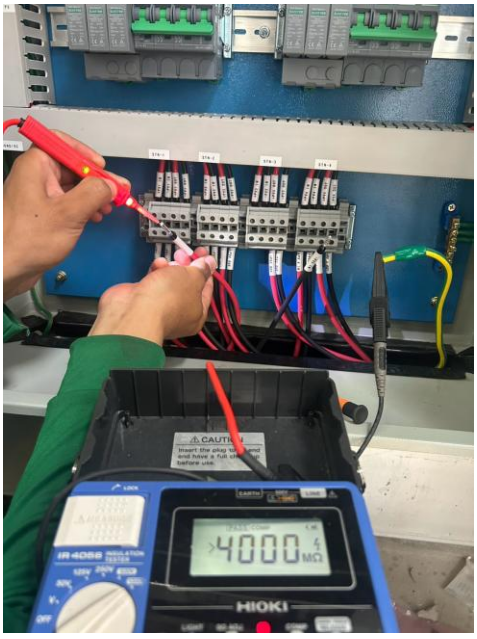

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.141 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP47) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.142 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP48) วัดที่สาย +,-วัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.143 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP48) วัดที่สาย +,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

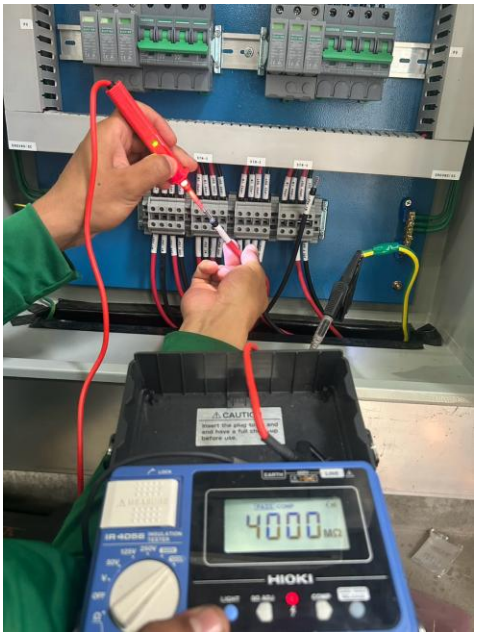

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

5.144 ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ DC (GROUP48) วัดที่สาย -,Groundวัดที่ 1000 Vdc ได้ค่า

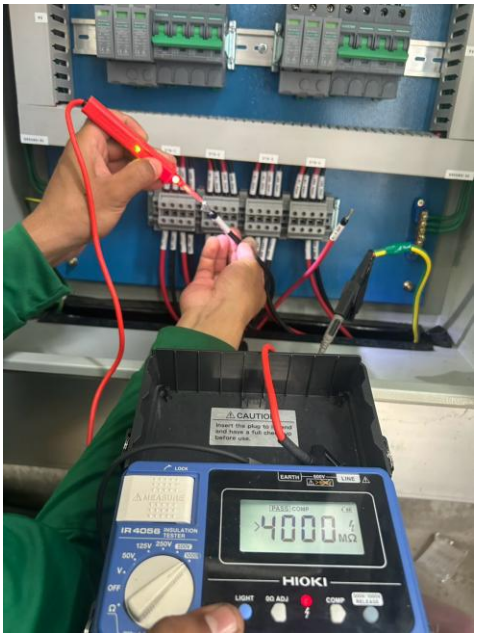

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

6.วัดค่าความต้านทานระหว่างหลักดินกับดิน

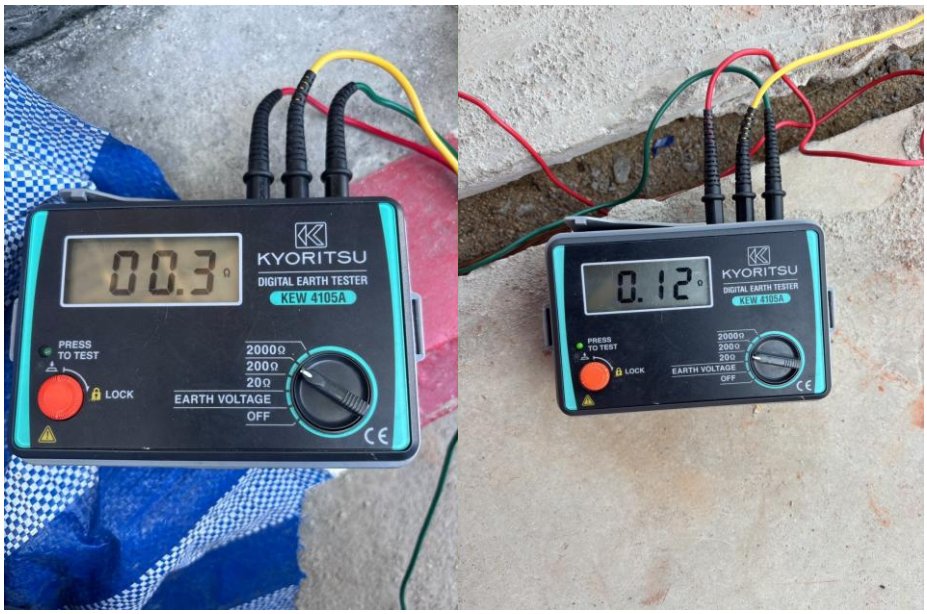

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

7.ตรวจสอบการติดตั้งตู้ไฟ

7.1ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของการจับยึด

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

7.2ตรวจสอบจุดเข้าสายขันน็อตให้แน่น

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

7.3ตรวจสอบความถูกต้องของสายมาร์คเกอร์ทุกจุด

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

8.ค่า Vout Main MCCB ตามแบบ Vac วัดค่าได้จริง

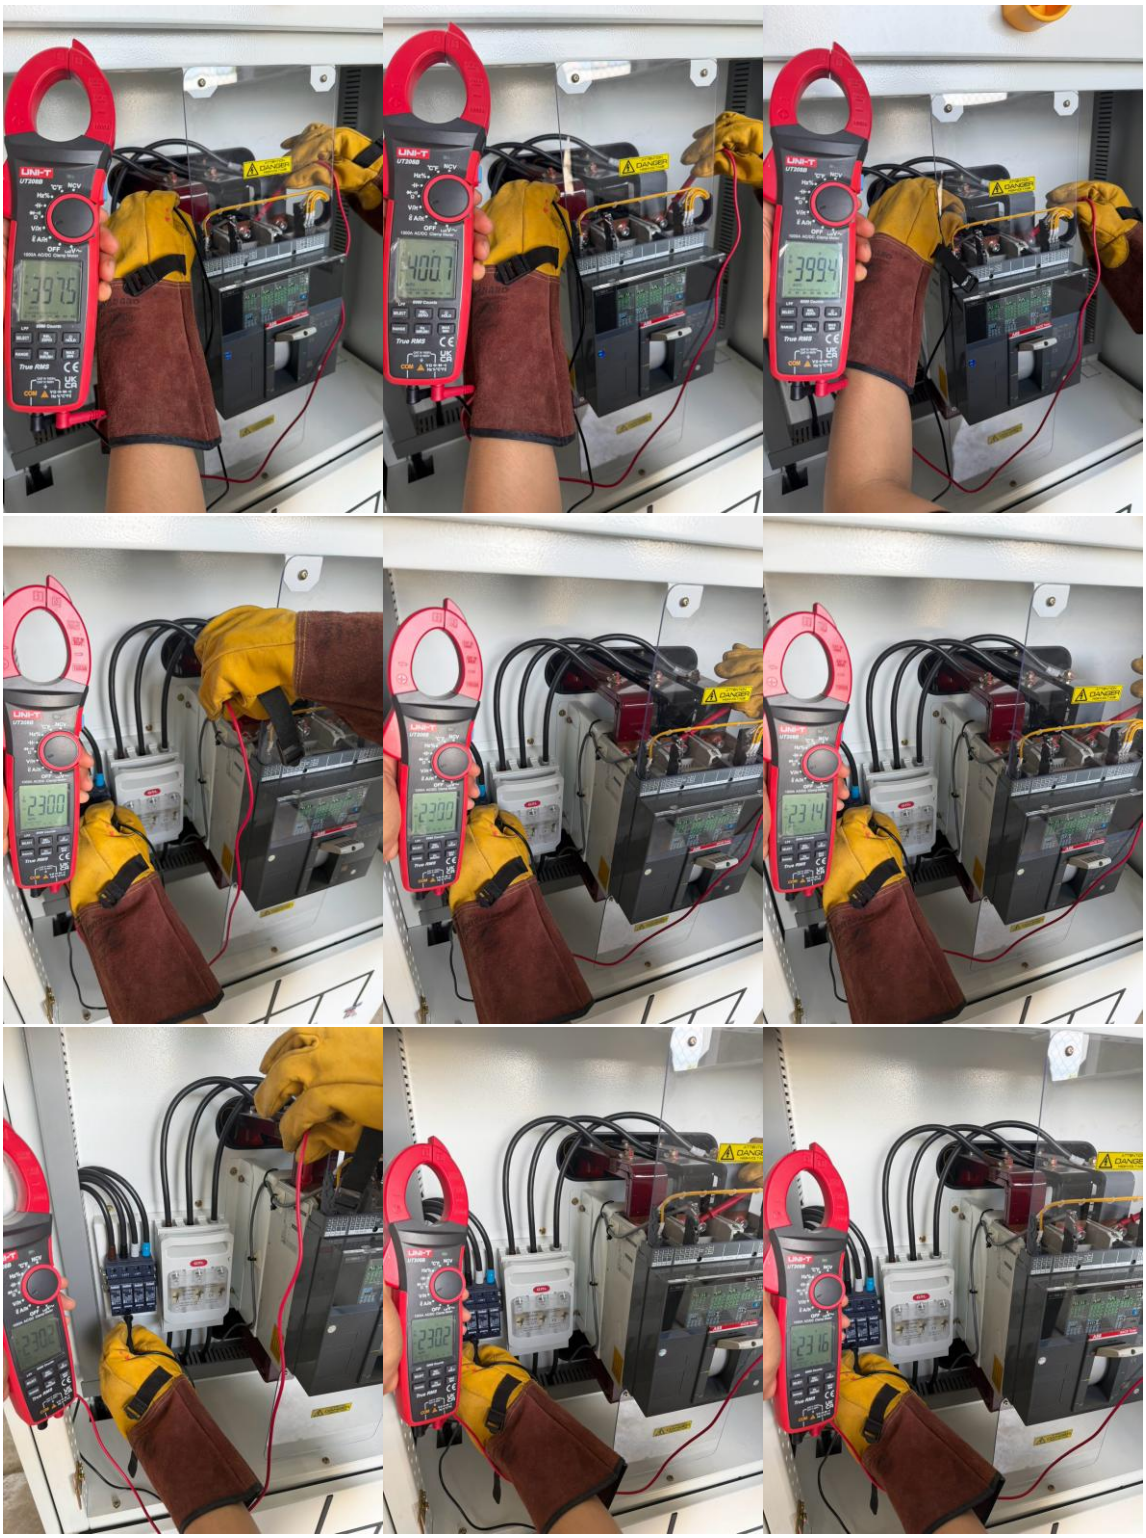

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

9.ค่า Vout Inverter1 ตามแบบ Vac วัดค่าได้จริง

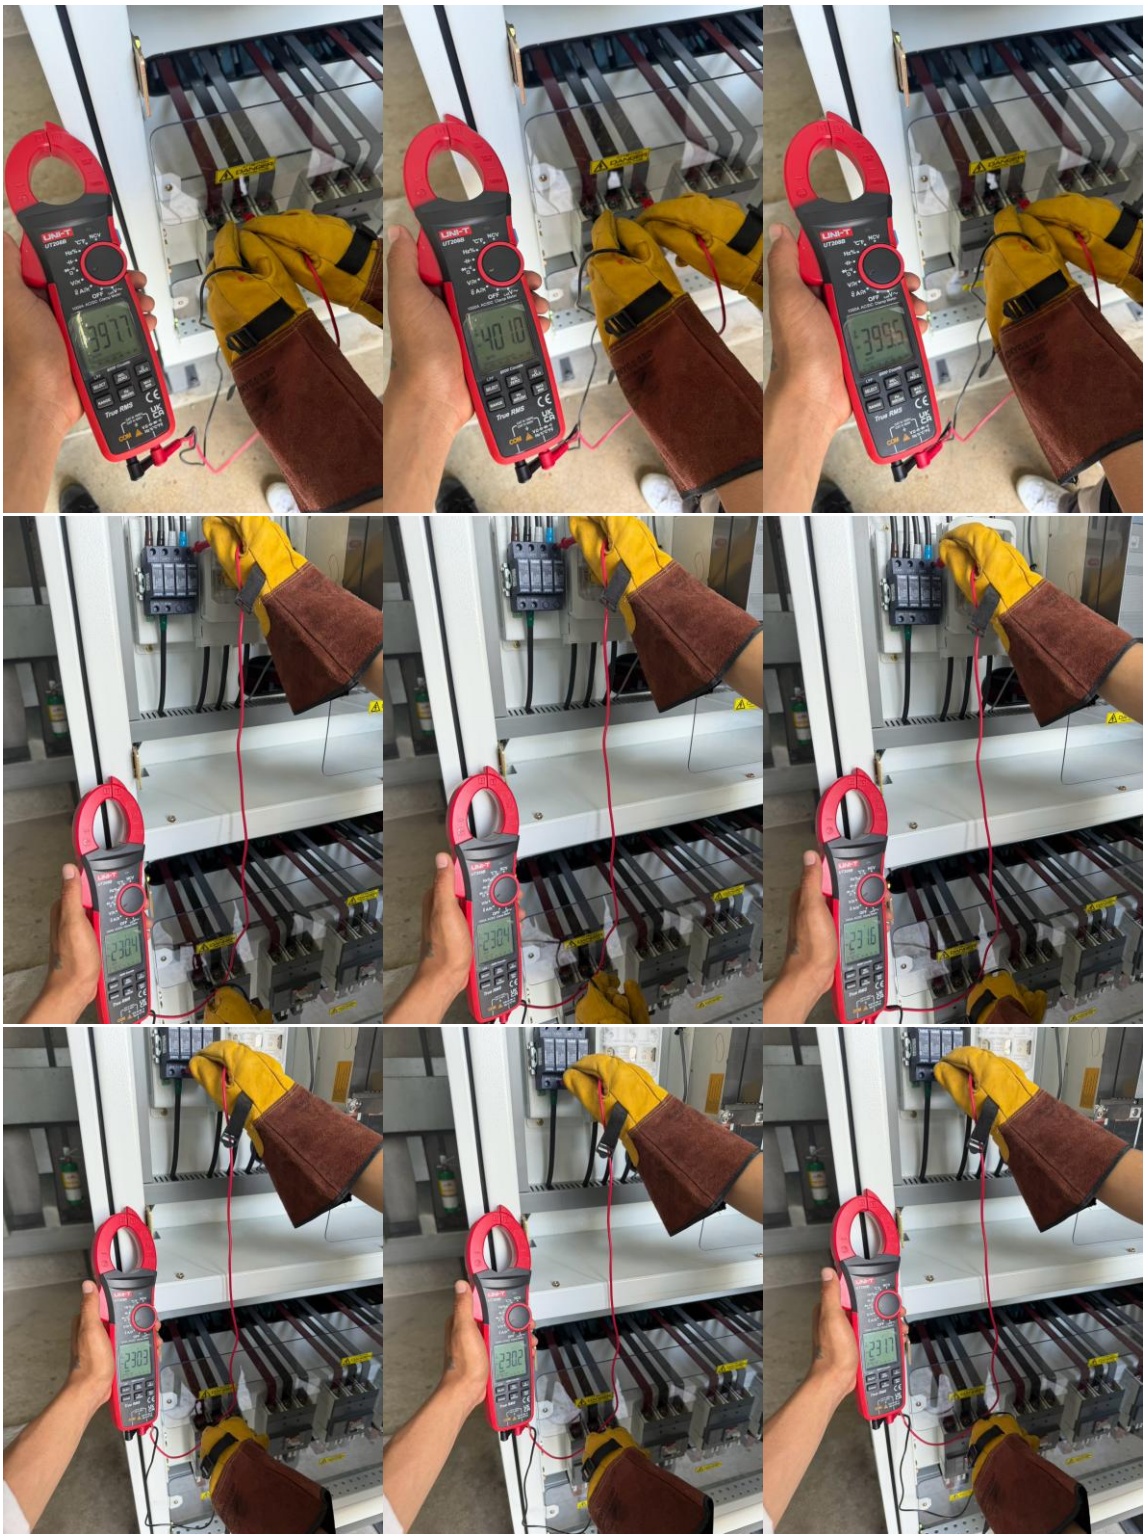

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

10.ค่า Vout Inverter2 ตามแบบ Vac วัดค่าได้จริง

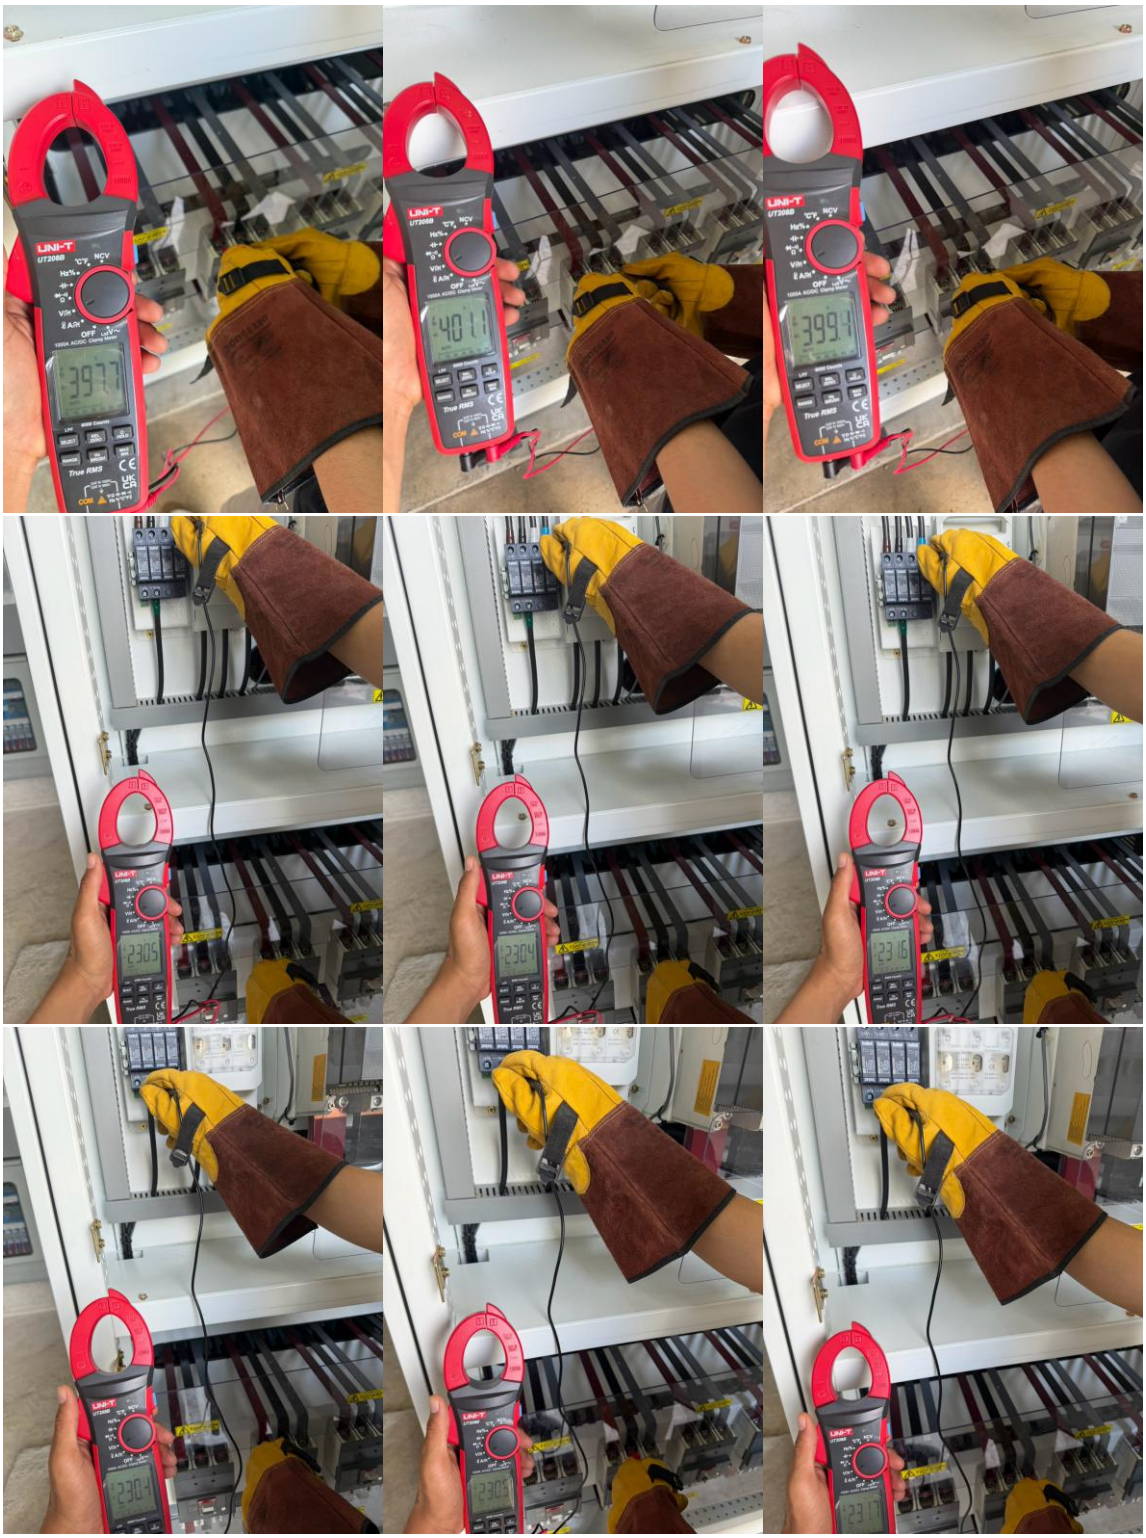

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

11.ค่า Vout Inverter3 ตามแบบ Vac วัดค่าได้จริง

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

12.ค่า Vout Inverter4 ตามแบบ Vac วัดค่าได้จริง

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

13.ค่า Vout Inverter5 ตามแบบ Vac วัดค่าได้จริง

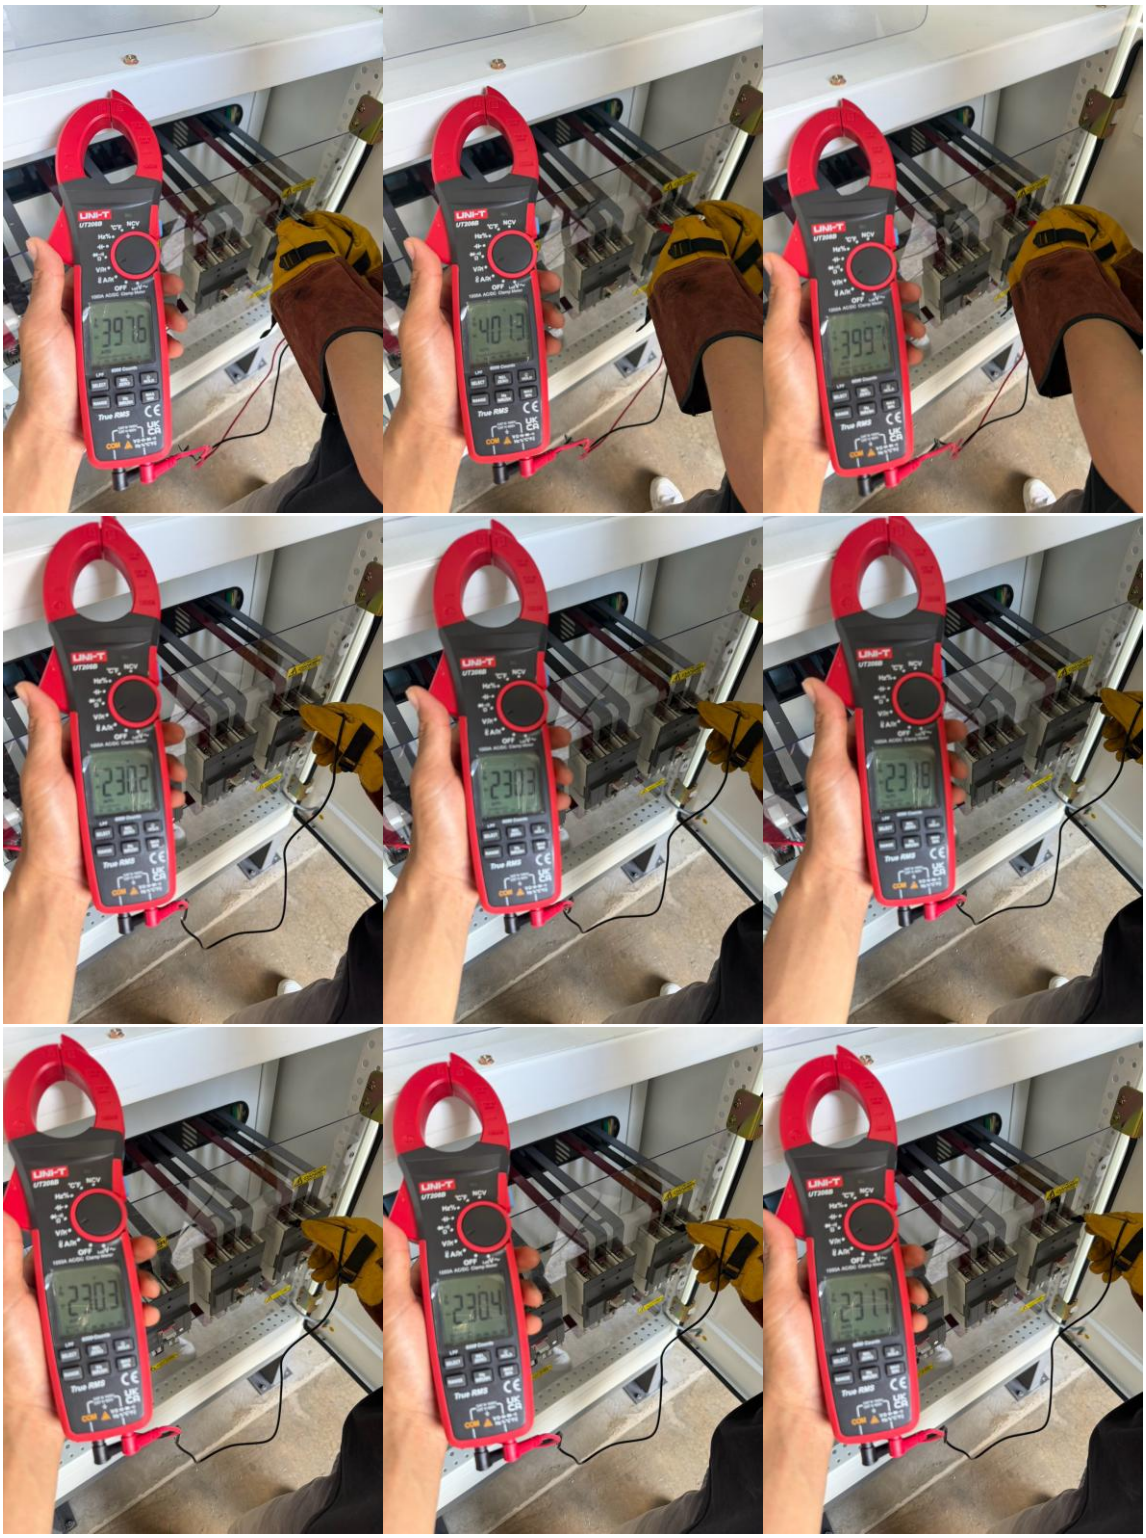

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

14.ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ AC MAIN MCCB วัดที่ 500 Vac ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

15.ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ AC Inverter1 วัดที่ 500 Vac ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

16.ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ AC Inverter2 วัดที่ 500 Vac ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

17.ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ AC Inverter3 วัดที่ 500 Vac ได้ค่า

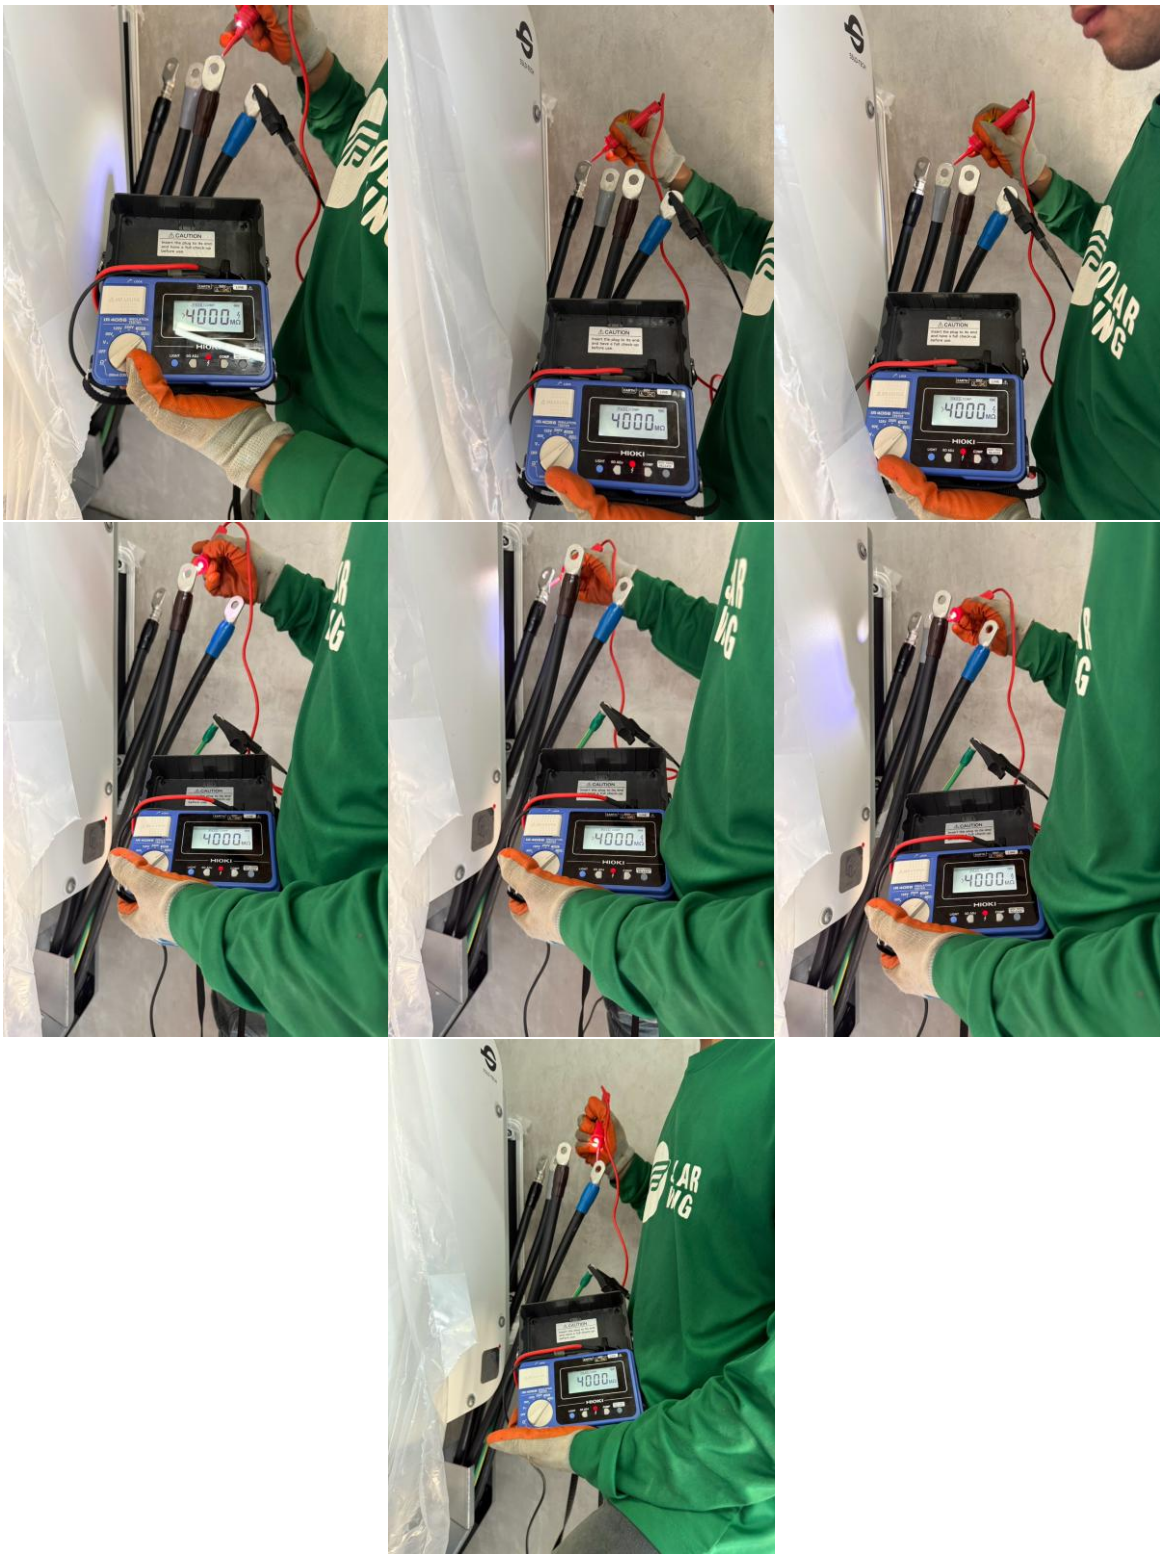

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

18.ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ AC Inverter4 วัดที่ 500 Vac ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

19.ค่าความเป็นฉนวนสายไฟ AC Inverter5 วัดที่ 500 Vac ได้ค่า

ผลที่ได้

[✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน
